


Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	.25 06	13	20	27	lis.25 03	10	17	24
1			Budowa Parkingu	407 dn	pon, 01.12.25								
2			Inicjacja projektu	10 dn	pon, 01.12.25								
3			Powołanie zespołu projektowego	5 dn	pon, 01.12.25								
4			Ocena lokalizacji	2 dn	pon, 01.12.25								
5			Stworzenie budżetu wstępnego	5 dn	pon, 08.12.25								
6			Planowanie	10 dn	pon, 15.12.25								
7			Szczegółowy harmonogram i plan ryzyka	3 dn	pon, 15.12.25								
8			Plan finansowania	5 dn	pon, 15.12.25								
9			Spotkania z mieszkańcami i interesariuszami	5 dn	pon, 22.12.25								
10			Badania i dokumentacja wstępna	15 dn	pon, 29.12.25								
11			Badania geotechniczne i inwentaryzacja terenu	15 dn	pon, 29.12.25								
12			Warunki przyłączy (woda, energia, kanalizacja)	15 dn	pon, 29.12.25								
13			Projektowanie	45 dn	pon, 19.01.26								
14			Koncepcja architektoniczna	15 dn	pon, 19.01.26								
15			Projekt konstrukcyjny i instalacje	30 dn	pon, 09.02.26								
16			Projekt systemu zarządzania parkingiem (liczniki miejsc, CCTV)	20 dn	pon, 19.01.26								
17			Kosztorys i harmonogram wykonawczy	15 dn	pon, 16.02.26								
18			Pozyskanie pozwoleń	60 dn	pon, 23.03.26								
19			Złożenie dokumentacji do urzędu, uzyskanie pozwoleń na budowę	60 dn	pon, 23.03.26								

Projekt: Parking Data: wto, 28.10.25	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Id.		Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	.25 06	13	20	27	lis.25 03	10	17	24
20			Uzyskanie warunków przyłączeń i zgód administracyjnych	50 dn	pon, 23.03.26								
21			Realizacja/Budowa	310 dn	pon, 23.03.26								
22			Przygotowanie placu budowy	10 dn	pon, 23.03.26								
23			Roboty ziemne i fundamenty	60 dn	pon, 15.06.26								
24			konstrukcja	100 dn	pon, 07.09.26								
25			Instalacje elektryczne, oświetlenie, CCTV, system zarządzania	50 dn	pon, 25.01.27								
26			Wykończenia, nawierzchnie, oznakowanie	40 dn	pon, 05.04.27								
27			Testy, szkolenia, odbiory	15 dn	pon, 31.05.27								
28			Testy systemów IT i integracja	10 dn	pon, 31.05.27								
29			Odbiory techniczne	10 dn	pon, 31.05.27								
30			Szkolenia personelu uczelni obsługi parkingu	5 dn	pon, 14.06.27								
31			Przekazanie i zamknięcie projektu	7 dn	pon, 14.06.27								
32			Formale przekazanie do eksploatacji	2 dn	pon, 21.06.27								
33			Dokumentacja powykonawcza i raport końcowy	3 dn	pon, 14.06.27								

Projekt: Parking
Data: wto, 28.10.25


Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
Podział		Podsumowanie ręczne	
Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
Tylko z czasem trwania			

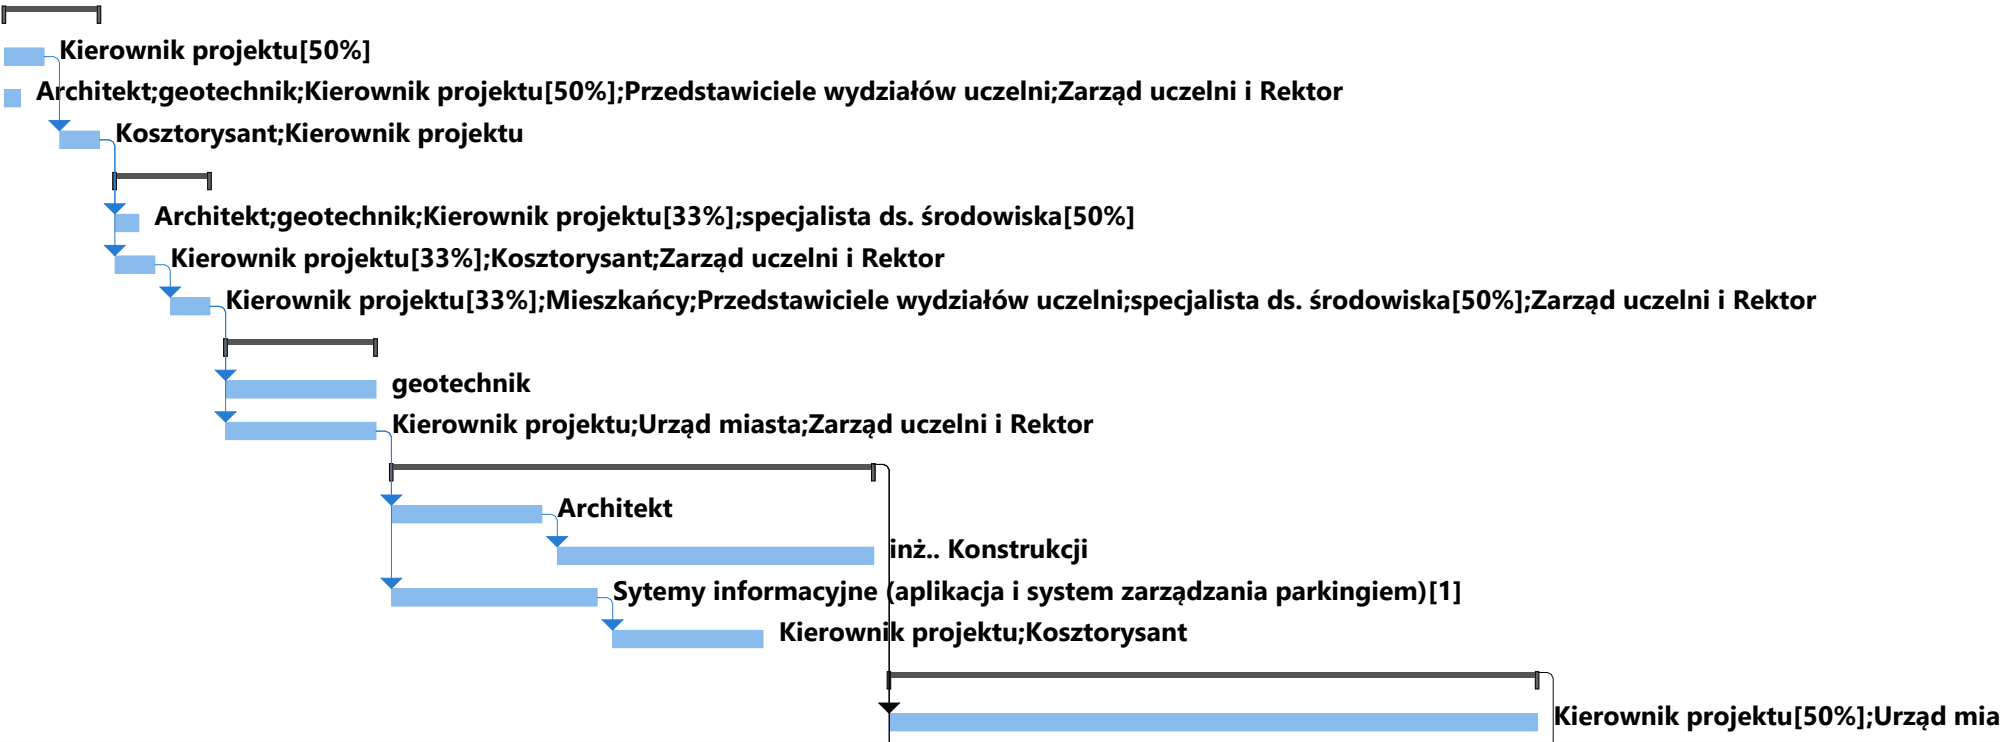

Projekt: Parking Data: wto, 28.10.25	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

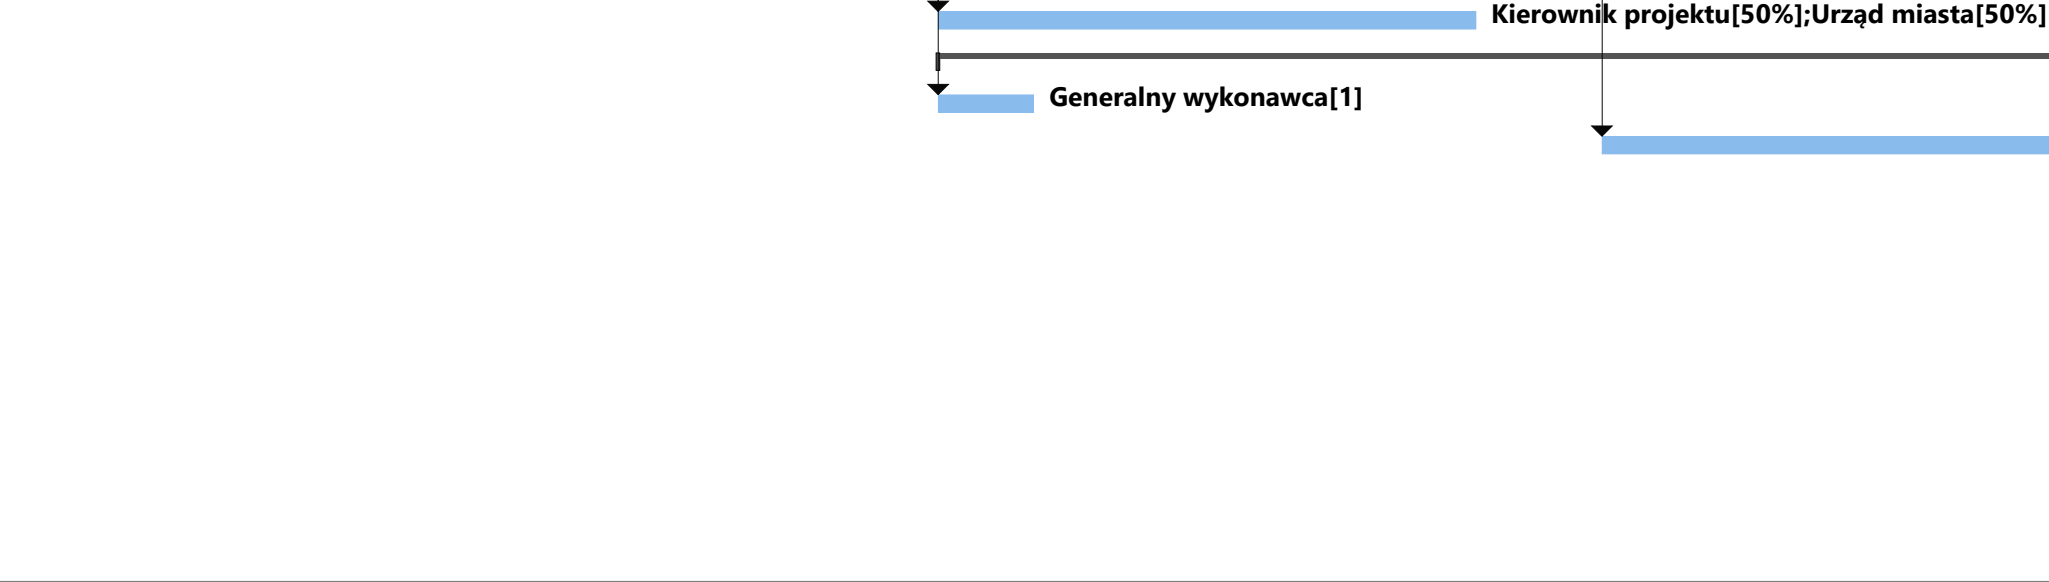

Projekt: Parking Data: wto, 28.10.25	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



iaasta[50%];Zarząd uczelni i Rektor

Projekt: Parking Data: wto, 28.10.25	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			


5]



Projekt: Parking Data: wto, 28.10.25	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			



Projekt: Parking Data: wto, 28.10.25	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			

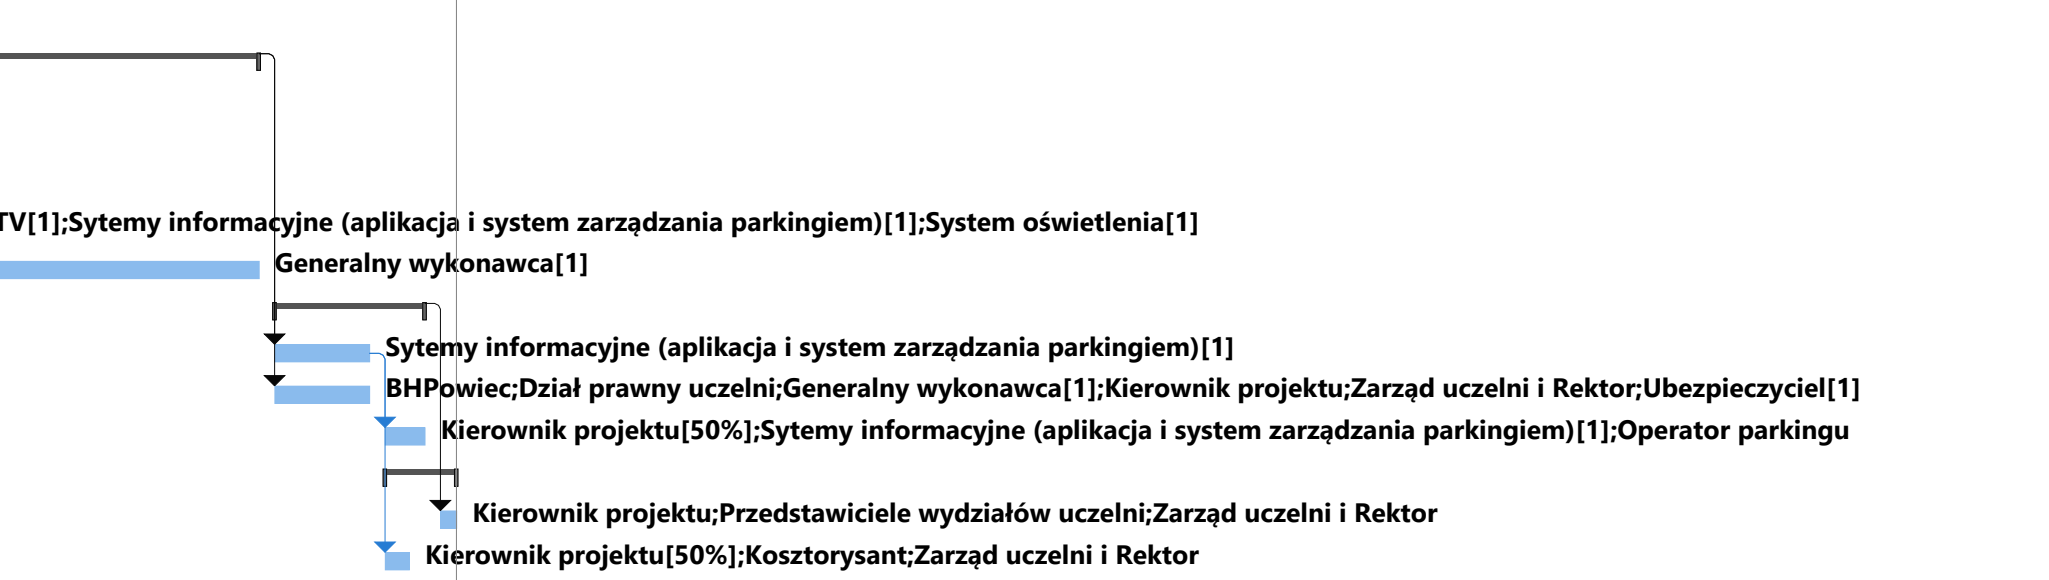

Projekt: Parking Data: wto, 28.10.25	Zadanie		Rzutowanie podsumowania ręcznego	
	Podział		Podsumowanie ręczne	
	Punkt kontrolny		Tylko z rozpoczęciem	
	Podsumowanie		Tylko z zakończeniem	
	Podsumowanie projektu		Zadania zewnętrzne	
	Zadanie nieaktywne		Zewnętrzne punkty kontrolne	
	Nieaktywny punkt kontrolny		Termin ostateczny	
	Podsumowanie nieaktywne		Postęp	
	Zadanie ręczne		Ręczne (postęp)	
	Tylko z czasem trwania			
